

CANTIERE B1

Linea T3

Libertà - Bagno a Ripoli

**viale Matteotti**

da piazza della Libertà  
a piazzale Donatello

**#TramviaFi** unire la città





Inizio lavori: **21/03/2025**

Estensione: **600 metri**

Durata: **66 settimane**

LIBERTÀ

MATTEOTTI

DONATELLO



DEPOSITO

T3

BAGNO A RIPOLI

LIBERTÀ - BAGNO A RIPOLI

# La riqualificazione della zona

**Tramvia al centro del viale,**  
fermate all'altezza  
di piazza Isidoro Del Lungo  
e di piazzale Donatello

**Restyling dei controviai**  
con nuovi marciapiedi  
e piste ciclabili,  
sagomatura delle aiuole

**Rinnovo di tutti i sottoservizi**  
tra cui il nuovo acquedotto

# La viabilità

Durante tutte le fasi sono garantite **due corsie per senso di marcia**.

Invariati i percorsi pedonali e ciclabili.  
Nessuna variazione per gli **autobus** urbani ed extraurbani.



PIAZZA  
DELLA  
LIBERTÀ

tratto di viale interessato dai cantieri

PIAZZALE  
DONATELLO

# Fase 1

Viale Matteotti nel tratto  
tra via Valori e via Fra' Bartolommeo

**Durata: 5 settimane**

# Fase 2

Viale Matteotti nel tratto  
tra via Benivieni e via Valori

**Durata: 4 settimane**

# Fase 3

Viale Matteotti nel tratto  
tra piazzale Donatello e via Benivieni


**Durata: 8 settimane**

# Fasi 1 - 2 - 3

**Durata complessiva: 17 settimane**

Cantiere tra viale e controviale in direzione piazza della Libertà. Realizzazione del nuovo acquedotto, sistemazioni stradali e opere a verde a intorno al filare alberato.

**Due corsie per senso di marcia**

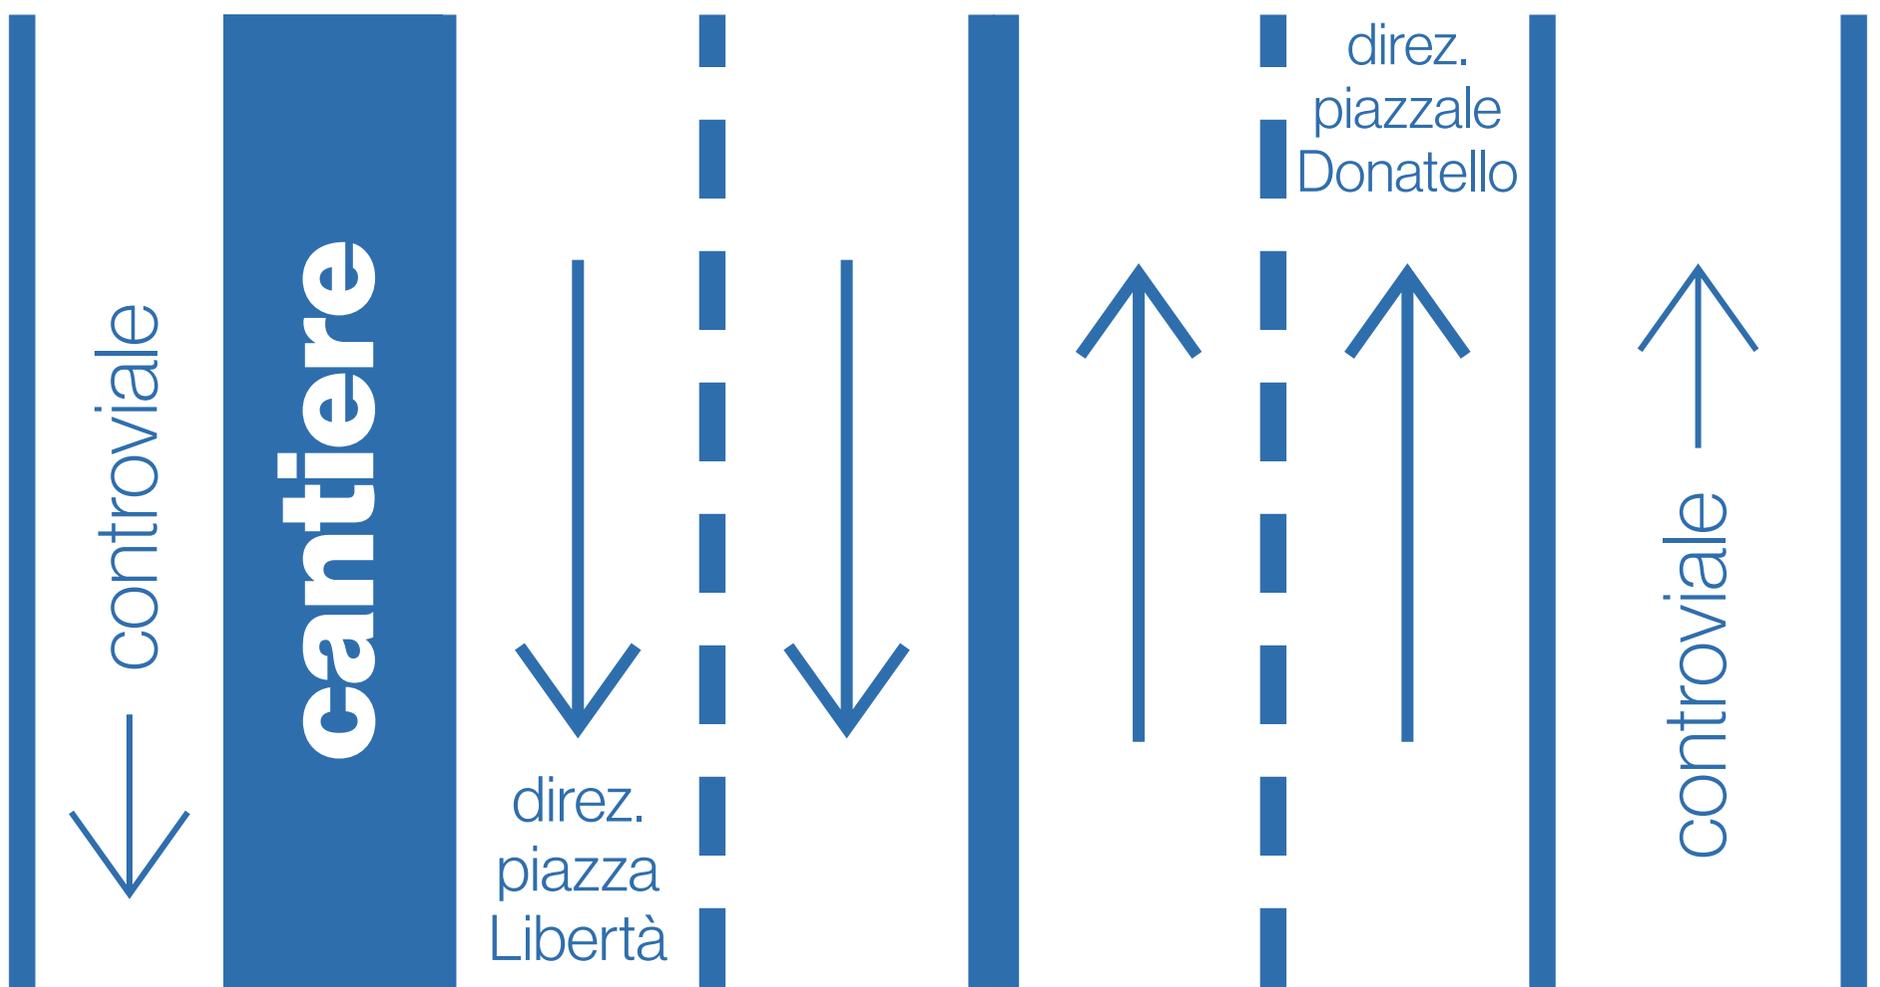

## Fase 4

Viale Matteotti nel tratto  
tra via La Marmora e via Cherubini

**Durata: 4 settimane**

## Fase 5

Viale Matteotti nel tratto  
tra via Cherubini e piazza I. Del Lungo

**Durata: 3 settimane**

## Fase 6

Viale Matteotti nel tratto  
tra piazza I. Del Lungo e piazzale Donatello


**Durata: 5 settimane**

# Fasi 4 - 5 - 6

**Durata complessiva: 12 settimane**

Cantiere tra viale e controviale in direzione piazzale Donatello. Realizzazione delle opere impiantistiche, sistemazioni stradali e opere a verde a intorno al filare alberato.

**Due corsie per senso di marcia**

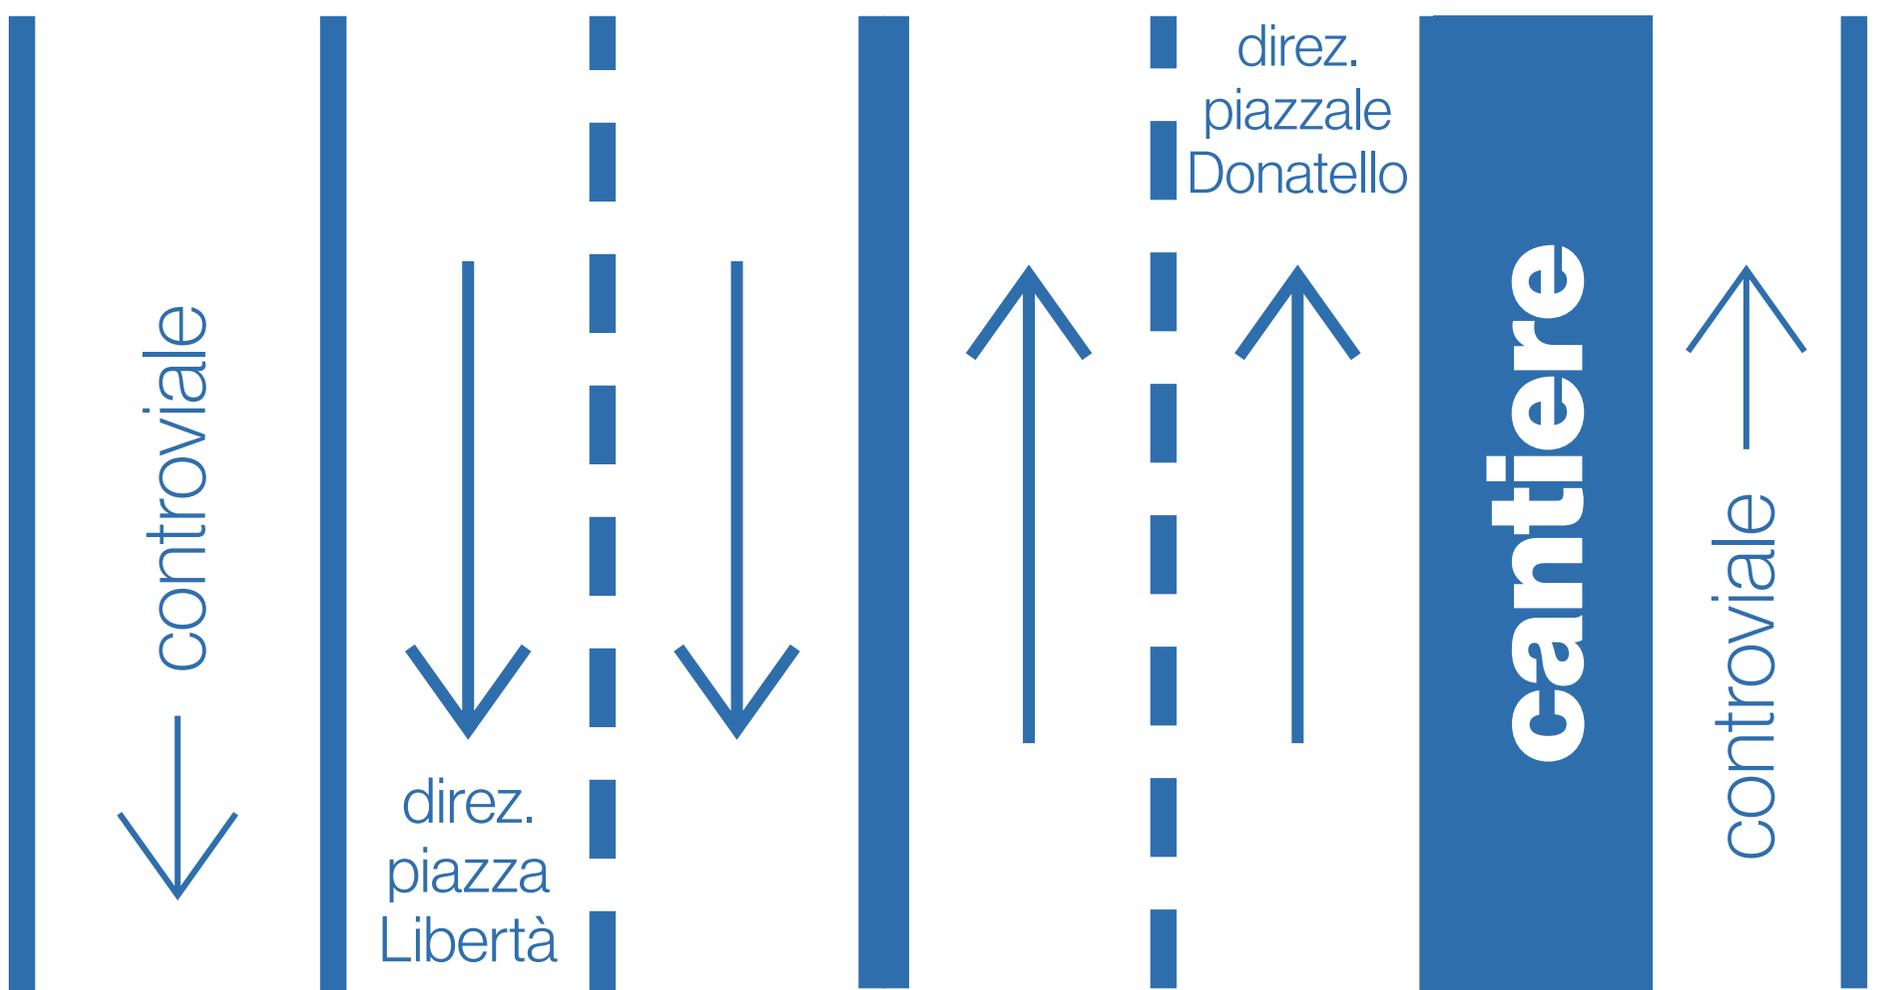


# Fase 7

**Durata: 27 settimane**

Cantiere nel centro del viale.  
Sistemazione dei sottoservizi,  
realizzazione della sede  
tramviaria e delle fermate  
*Matteotti e Donatello.*

**Due corsie per senso di marcia**

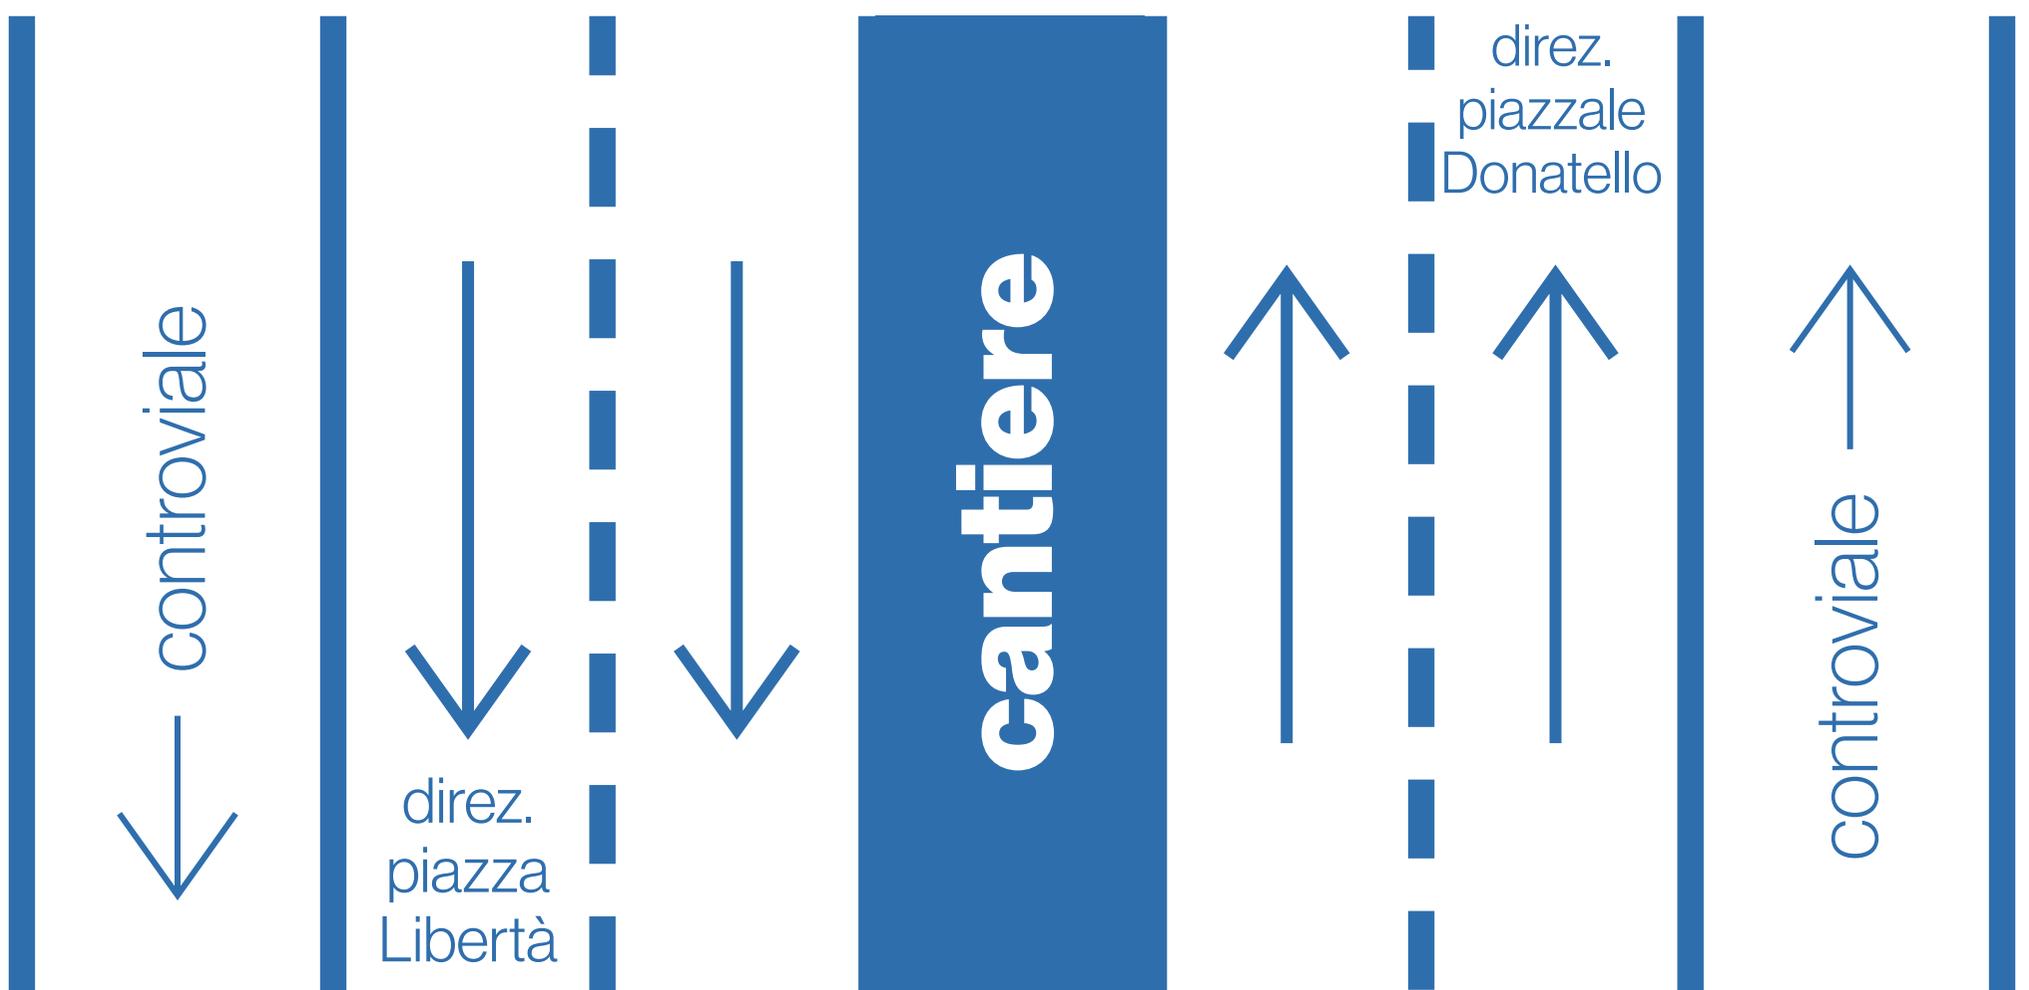


# Fase 8

**Durata: 10 settimane**

Cantiere nei controviai  
che saranno chiusi a tratti.

Sede tranviaria ultimata al centro  
del viale, lavori di riqualificazione  
urbanistica dei controviai.

**Due corsie per senso di marcia**

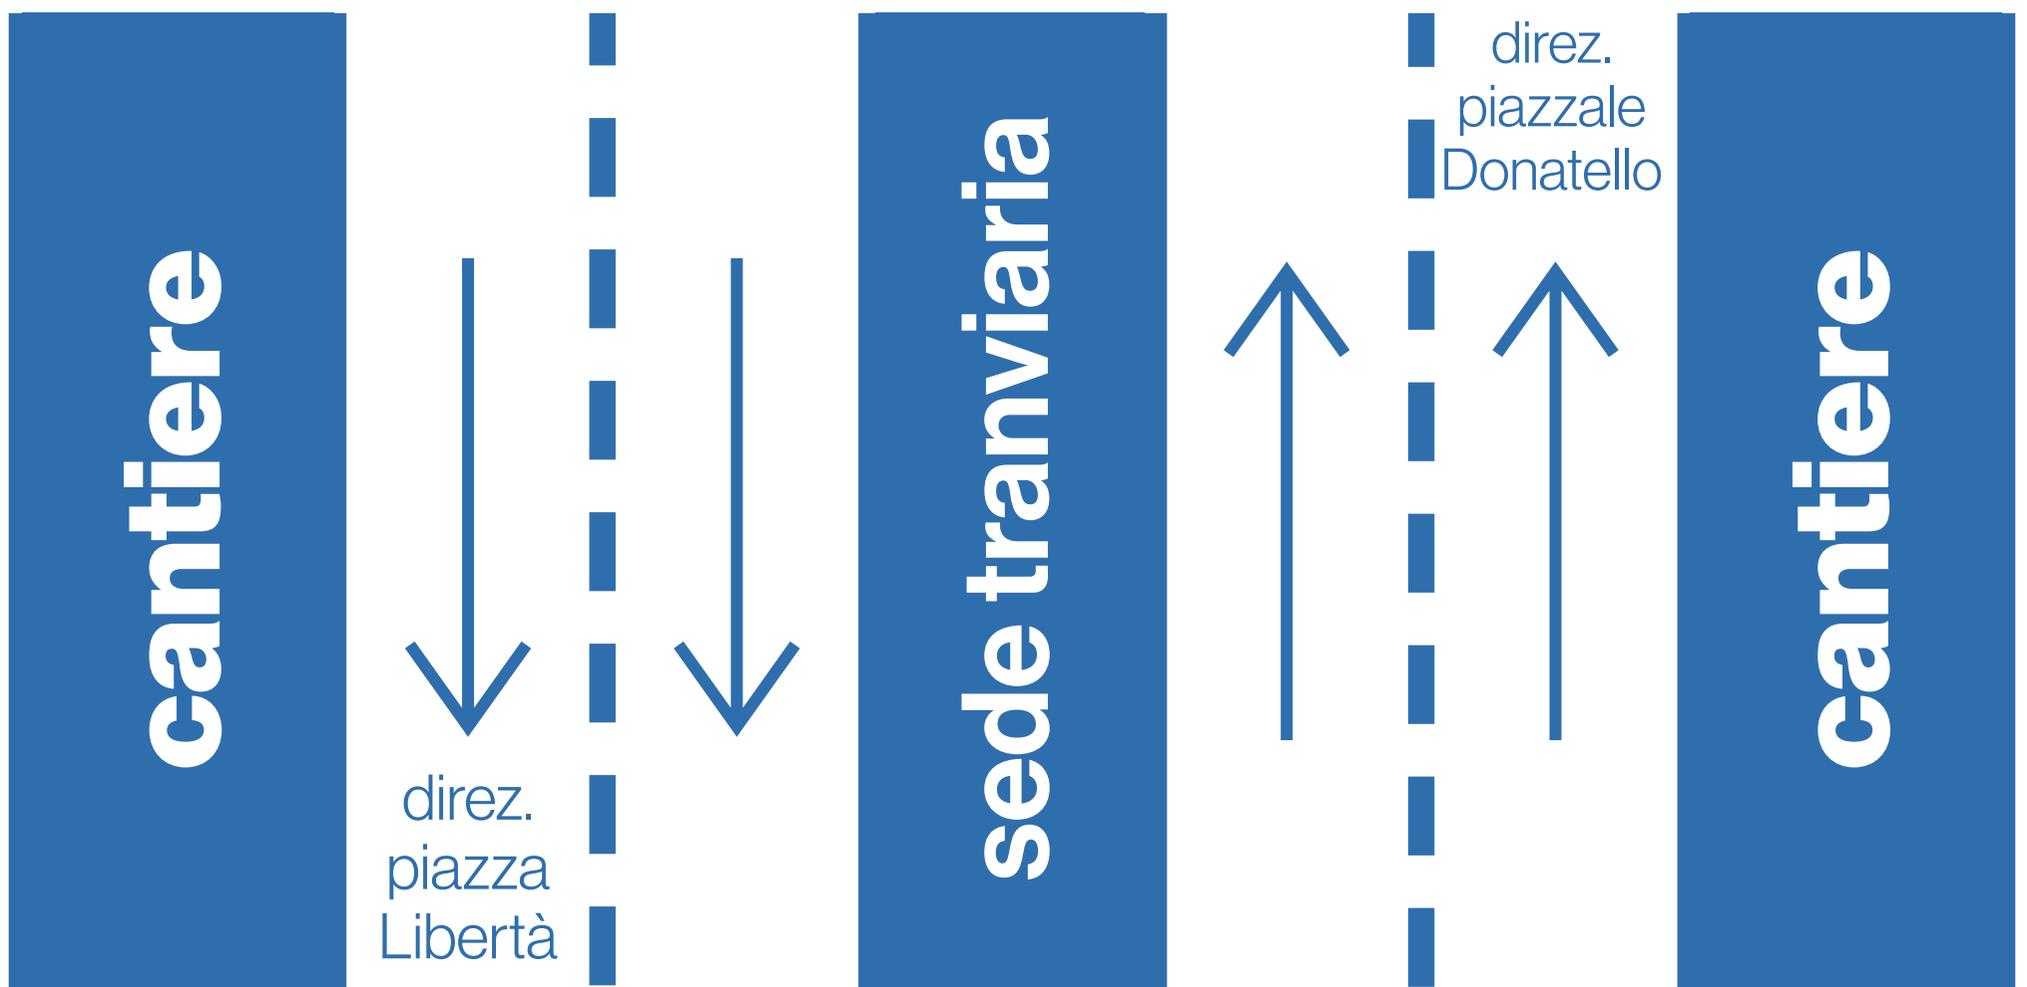

**#TramviaFi**  
unire la città

